PROGRAMMA LAVORI E19 Gordola PIU' LAVORI COMUNALI OFFERTA 023-23P

Ultimo Aggiornamento: 12.05.2023
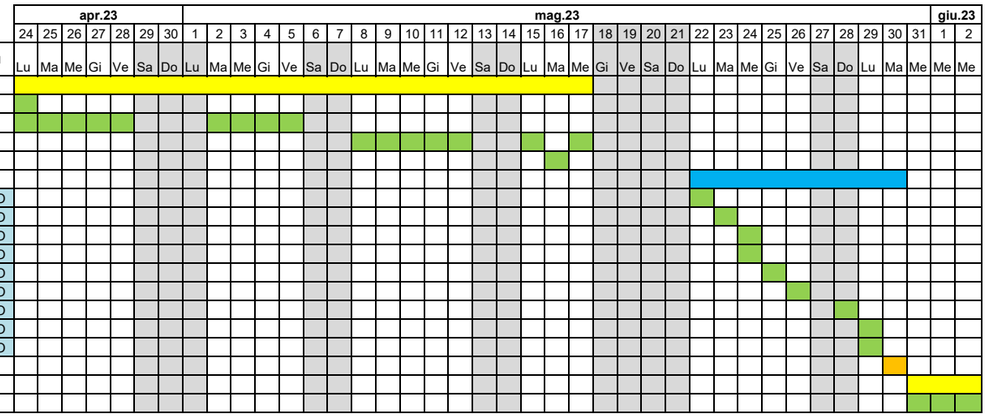
		Da pr.	A pr.	L.	m2	Fresato m3 scioti	Miscela t.	OSSERVAZIONI
1	**LAVORI DIURNI**							
2	Nuova installazione di cantiere							
3	Completamento sostituzione griglie-chiusini-caditoia supplementare-delimitazioni bordi	435.00	590.00					
4	Sistemazione piazzali esterni e marciapiedi	435.00	590.00					
5	**OFFERTA 023-23P (lavori diurni)-Via burio comune**							
6	**LAVORI NOTTURNI**							
7	Fresatura pavimentazione corsia Monte-sistemazione dei piani, esecuzione plania, ACT 22 S 70 mm ed esecuzione rampetta centrale	435.00	590.00	155.00	542.50	137.50	95.70	BUS PICCOLO
8	Fresatura pavimentazione corsia Valle-sistemazione dei piani, esecuzione plania, ACT 22 S 70 mm ed esecuzione rampetta centrale	435.00	590.00	155.00	542.50	137.50	95.70	BUS PICCOLO
9	Fresatura pavimentazione L.O. lato DIGA, Pulizia superficie bituminosa esistente, protezione dei bordi e delle ghise	590.00	640.00	50.00	350.00	23.80		BUS PICCOLO
10	**Fresatura pavimentazione TORNANTE, esecuzione plania, ACT 22 S 70 mm ed esecuzione rampetta centrale. (OFFERTA 023-23P)**	/	/	55.00	220.00		55.00	BUS PICCOLO
11	Esecuzione SAMI, fornitura e posa SDA 4-12 30 mm, taglio del giunto con disco fissato al rullo-corsia MONTE	0.00	320.00	320.00	960.00		75.00	BUS PICCOLO
12	Rimozione giunto-esecuzione SAMI, fornitura e posa NASTRO TOK-BAND 30*10,fornitura e posa SDA 4-12 30 mm-corsia VALLE	0.00	320.00	320.00	960.00		75.00	BUS PICCOLO
13	Esecuzione SAMI, fornitura e posa SDA 4-12 30 mm, taglio del giunto con disco fissato al rullo-corsia MONTE	320.00	640.00	320.00	960.00		75.00	BUS PICCOLO
14	Rimozione giunto-esecuzione SAMI, fornitura e posa NASTRO TOK-BAND 30*10,fornitura e posa SDA 4-12 30 mm-corsia MONTE	320.00	640.00	320.00	960.00		75.00	BUS PICCOLO
15	**Emulsione pavimentazione TORNANTE, fornitura e posa NASTRO TOK-BAND 30*10, fornitura e posa AC 8 H 30 mm. (OFFERTA 023-23P)**	/	/	55.00	220.00		20.00	BUS PICCOLO
16	**RIPOSO**							
17	**LAVORI DIURNI**							
18	Esecuzione piazzale Installazione e disinstallazione cantiere
